



INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
INVESTICIJE PREDVIDENE ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOSTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR) - 100.000 EUR in več								
1.	<u>07380</u>		<u>Zeleni pas ob Magistrali</u> OB084-23-0158 Zeleni pas ob Magistrali	168.425,00	0,00	20,93%	Projekt je v pripravljalni fazi. Zaključuje se razširjena projektna in investicijska dokumentacija. Projekt je v fazi pridobivanja služnosti in mnenj, zato bo potrebno ponovno projekt prijaviti na poziv posredniškega telesa ZMOS (1. faza potrjevanja projekta). Do konca leta 2026 se bo izdelalo vlogo za neposredno potrditev projekta za koriščenje nepovratnih sredstev PEKP 21-27, in sicer v okviru mehanizma CTN, prednostna naloga 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO2.7 »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)« (2. faza potrjevanja projekta). Vlogo za neposredno potrditev se bo posredovalo na posredniško telo Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP). Sama izvedba projekta se zamika v leto 2027/28.	
2.	<u>07389</u>		<u>Urbanistično prometna prenova ulic Solkana</u> OB084-24-0095 Urbanistično prometna prenova ulic Solkana	161.523,00	35.380,00	77,94%	MONG, ob vzporedni prenovi oz. gradnji Magistralnega vodovoda in skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo in veljavnimi določili OPN MONG, pristopa k urbanistično prometni prenovi ulic Solkana. Projekt se bo izvajal po fazah, skladno s predvidnimi fazami gradnje Magistralnega vodovoda. Projekt je v zaključni fazi projektiranja. Izdeluje se investicijska dokumentacija in pripravlja vloga za sofinanciranje. V letu 2026 je predvidena prijava projekta na koriščenje nepovratnih sredstev PEKP 21-27, in sicer v okviru mehanizma CTN, prednostna naloga 4 »Trajnostna mobilnost«, specifičnega cilja RSO2.8 »Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika«.	
3.	<u>07385</u>		<u>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019 Loke</u> OB084-24-0089 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019	875.127,00	0,00	3,26%	Projekt je del skupnega projekta »Kanalizacija v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019«, ki se izvaja v partnerstvu Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba ter je uvrščen v DRR (regijski razvoj). Na območju Mestne občine Nova Gorica je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Loke, ki vključuje izgradnjo fekalnih kanalov PP DN 200/250 v skupni dolžini cca. 1900 m ter treh tlačnih fekalnih vodov s pripadajočimi črpalski v skupni dolžini cca. 1.000 m. Projektna dokumentacija DGD in PZI je v izdelavi. Za izvedbo investicije je pravica graditi na potrebnih zemljiščih skoraj v celoti pridobljena, v postopku pridobivanja sta še dve preostali soglasji. Po zaključku priprave dokumentacije in pridobitvi vseh potrebnih pravic bo sledil postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja ter izvedba investicije.	
4.	<u>07386</u>		<u>Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek</u> OB084-24-0090 Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek	1.614.646,00	0,00	0,00%	Projekt je uvrščen v Dogovor za razvoj regije. Trenutno poteka priprava investicijske dokumentacije (PIZ in IP) ter usklajevanje tehničnih, finančnih in terminskih podlag med vsemi partnerji projekta. Zbirajo se zadnje različice DGD, ocene investicijske vrednosti, finančne konstrukcije, terminski načrti in podatki o morebitnih spremembah projekta glede na DIIP. Za pripravo IP bo po dokončanju PIZ zagotovljena še projektna dokumentacija PZI ter dokončno usklajeni tehnični, finančni in terminski podatki. Projekt se redno usklajuje v okviru partnerstva občin in Dogovora za razvoj regij, pri čemer se spremljajo vse spremembe investicijske vrednosti in ostala odstopanja od potrjenega projekta. Po trenutno razpoložljivih podatkih bistvenih sprememb namena, partnerstva ali tehničnih rešitev glede na DIIP ni bilo zaznanih.	
INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2026 - 100.000 EUR in več								
5.	<u>06008</u>		<u>Vzdrževanje objektov v lasti občine</u> OB084-24-0094 Sanacija strešne kritine PTP	223.491,00	223.490,41	100,00%	Investicija uspešno zaključena. V sodelovanju z Občino Šempeter - Vrtojba je bila izvedena sanacija dotrajane strešne kritine objekta PTP. Z izvedenimi deli je bila zagotovljena ustrežna zaščita objekta pred vremenskimi vplivi, izboljšana njegova funkcionalnost ter zagotovljeni pogoji za dolgoročno ohranjanje objekta. Investicija je bila izvedena v okviru sodelovanja obeh občin pri zagotavljanju ustreznih pogojev za uporabo in vzdrževanje skupne infrastrukture.	

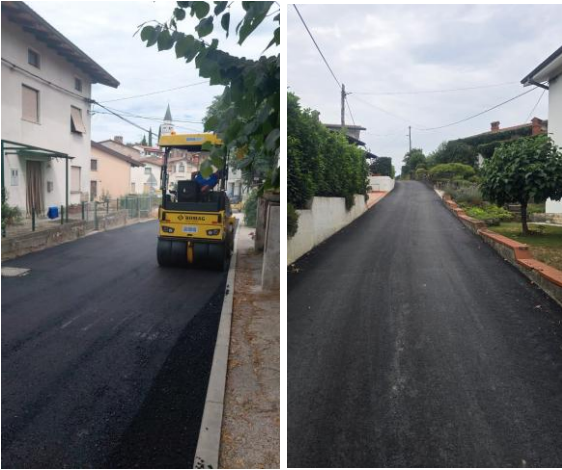
INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
06008	OB084-25-0079		Vzdrževanje objektov v lasti občine	180.000,00	57.198,09	53,94%	Vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Nova Gorica – aktivnosti se izvajajo kontinuirano skozi vse leto. V okviru rednega in investicijskega vzdrževanja se izvajajo sanacije, obnove in izboljšave občinskih objektov ter pripadajoče infrastrukture, s ciljem zagotavljanja varne in nemotene uporabe ter dolgoročnega ohranjanja objektov. V okviru programa so bila med drugim izvedena naslednja dela: - sanacija objekta Čolarna Solkan, - ureditev tlakovanja letnega vrta pri ZD Gradnikove brigade, - ureditev ozvočenja na letnem bazenu, - sanacija streh vrtecev Ciciban, Kekec in Centralni vrtec, - sanacija sanitarij za invalide na letnem bazenu, - pleskanje fasade letnega bazena, - izvedba ograje v okviru razstave EPIC.	
6.	07054		Konteinerska mesta in ekološki otoki OB084-23-0043 Ekološki otoki	204.000,00	51.309,52	58,82%	Projekt urejanja ekoloških otokov je tudi v letu 2026 v fazi izvajanja in se izvaja skladno z zastavljenimi cilji ter načrtovano dinamiko. Izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev treh ekoloških otokov in dokumentacija za odstranitev enega ekološkega otoka, na mestu katerega so bila urejena tri parkirna mesta. Na ekološkem otoku na Vetrišču je bila izvedena postavitev tipske ograje, ekološki otok na Rutarjevi ulici je bil razširjen, na Cankarjevi 74 pa je bil obstoječi ekološki otok obnovljen skladno s tipsko zasnovo. Do konca leta 2026 je predvidena nadaljnja izvedba najmanj treh ekoloških otokov po tipski zasnovi in sicer obnova obstoječega ekološkega otoka na Trubarjevi ulici v Novi Gorici, obnova ekološkega otoka v KS Ozeljan pri Ozlinki ter gradnja novega ekološkega otoka ob betonski garaži na Cankarjevi ulici v Novi Gorici. Novi ekološki otok bo nadomestil dva obstoječa ekološka otoka, ki bosta po izvedbi nove ureditve odstranjena. Prav tako je predvidena ureditev novega ekološkega otoka v KS Osek - Vitovlje. Projekt se bo tako nadaljeval tudi v drugi polovici leta 2026, pri čemer se bodo izvedle načrtovane investicije in nadaljnje ureditve obstoječih in novih lokacij. Osnovni namen in cilji projekta bodo v letu 2026 doseženi. Zastavljeni kazalniki za tekoče leto bodo predvidoma realizirani do konca leta, saj je izvedba načrtovanih aktivnosti v teku in poteka skladno z načrtovano dinamiko.	 
7.	07199		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju	128.000,00	0,00	15,63%	Priključitev zimskega bazena na sistem daljinskega ogrevanja – postopek javnega naročila je v teku. Po zaključku postopka in izboru izvajalca je izvedba investicije predvidena v drugi polovici leta 2026.	
				130.000,00	0,00	100,00%	V letu 2026 je predvidena finančna zaključitev investicije v obnovo toplotne postaje na naslovu Ulica Gradnikove brigade 39. Hkrati je v drugi polovici leta predviden začetek obnove toplotne postaje na naslovu Ulica Gradnikove brigade 29. Investicijo vodi JP KENOG d.o.o.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
	07199	OB084-25-0020	Obnova toplotne postaje nebotičnika	100.000,00	99.834,54	100,00%	Obnova toplotne postaje nebotičnika je bila tudi finančno zaključena	
8.	07246	OB084-23-0150	Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema	129.339,00	0,00	88,91%	V tem letu so/bodo izvedena investicijsko-vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu Mestne občine Nova Gorica.	
9.	07286	OB084-23-0159	Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Investicijsko vzdrževanje ČN 2025-2027	100.000,00	0,00	100,00%	V tem letu so/bodo na Centralni čistilni napravi Nova Gorica izvedena obnovitvena dela na opremi (črpalke, ventili, vzorčevalniki, preša za dehidracijo blata, varnostni ventil in nivojska zaščita).	
		OB084-25-0015	Zamenjava membranskih sklopov na CCN Nova Gorica	410.116,00	0,00	0,00%	Projekt obsega celovito zamenjavo membranskih sklopov na Centralni čistilni napravi Nova Gorica ter nadgradnjo sistema prežračevanja. Predvidena je dobava in postopna zamenjava vseh 32 membranskih kaset v osmih membranskih bazenih z novo generacijo membran, vgradnja dodatnega puhalja zraka, posodobitev sistema vpihovanja zraka ter izvedba vseh spremljajočih strojnih, elektro in avtomatizacijskih del. Projekt se izvaja kot skupno naročilo Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Miren-Kostanjevica, postopek javnega naročila pa v njihovem imenu vodi pooblaščen naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Dela bodo izvedena po določilih FIDIC Rumene knjige, z zamenjavo membranskih sklopov v dveh fazah do leta 2028 ter zagonskimi preizkusi, poskusnim in rednim obratovanjem prenovljenega sistema.	
10.	07302	OB084-20-0020	Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek Magistralni vodovod DN 700	305.400,00	0,00	95,35%	Projekt obsega obnovo magistralnega vodovoda DN700 ter povezane odseka DN500, ki se pripravljata v okviru dveh ločenih projektov. Dokumentacija in pod vodstvom dveh projektantov. Za oba odseka je izdelana dokumentacija DGD, vloži za izdajo gradbenega dovoljenja pa sta že vloženi na Upravno enoto Nova Gorica. Hkrati sta za oba projekta naročeni projektni dokumentaciji PZI, ki sta trenutno v izdelavi. Obnova bo nadomestila dotrajane odseke magistralnega vodovoda, izboljšala zanesljivost oskrbe s pitno vodo ter omogočila dolgoročno varno obratovanje regionalnega vodovodnega sistema.	
11.	07357	OB084-21-0055	Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)	500.000,00	0,00	0,00%	Investicija v fazi projektiranja. V okviru priprave investicije je bila izdelana projektna naloga ter v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) naročena izdelava projektne dokumentacije. Aktivnosti so trenutno usmerjene v pripravo in usklajevanje projektnih rešitev, medtem ko izvedba gradbenih del v letu 2026 še ni predvidena.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	pp	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
12.	07366		<u>Vodovod Mestna občina Nova Gorica</u>					
		OB084-23-0032	KS Nova Gorica - javni vodovod	150.000,00	0,00	3,09%	Projekt obsega rekonstrukcije javnega vodovodnega omrežja na območju KS Nova Gorica.	
		OB084-23-0062	KS Osek-Vitovlje - javni vodovod	386.951,00	382.140,77	98,76%	Projekt obsega novogradnjo vodohrana Vitovlje za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo na območju Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje. Gradnja vodohrana je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje, trenutno pa potekajo še zaključna in ureditvena dela. Z investicijo se izboljšujejo pogoji za varno in kakovostno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.	
13.	02367		<u>Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica</u>					
		OB084-23-0065	KS Ravnica - javni vodovod	103.000,00	0,00	97,09%	Projekt obsega izgradnjo javnega vodovoda za zaselek pri Peči pri Ravnici. V letu 2026 bo izvedena izgradnja novega vodovodnega omrežja, s katerim se bo izboljšala oskrba prebivalcev s pitno vodo. Za investicijo je izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljena pa je tudi pravica graditi na vseh potrebnih zemljiščih. Projekt bo prispeval k zagotavljanju zanesljive ter varne oskrbe s pitno vodo na območju.	
		OB084-23-0018	Kanalizacija Gradišče	2.733.801,00	2.733.729,95	100,00%	Projekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije in druge gospodarske javne infrastrukture na območju Gradišča nad Prvačino. Z investicijo je vzpostavljen sodoben in energetsko učinkovit sistem za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s čimer se izboljšujeta kakovost bivanja in varstvo okolja na območju naselja, hkrati pa se zmanjšujejo tudi vplivi, ki prispevajo k plazenju terena. Projekt je praktično zaključen, pridobljeno je uporabno dovoljenje, trenutno pa potekajo še zaključna in ureditvena dela ter povrnitev površin v predhodno stanje. Investicija je bila sofinancirana iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), preostanek sredstev pa je zagotovila Mestna občina Nova Gorica.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
	07367	OB084-23-0024	KS Nova Gorica - javna kanalizacija		280.600,00	0,00	81,87% Projekt obsega rekonstrukcijo javne kanalizacije na območju KS Nova Gorica.	
14.	07376	OB084-23-0092	Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa		2.298.000,00	0,00	100,00% Avtobusi so bili dobavljeni konec julija. Proračunska postavka bo v celoti realizirana po poteku zakonsko določenega plačilnega roka za poravnavo računa.	
15.	07377	OB084-25-0078	Rekonstrukcija cestnega omrežja Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v obdobju 2026-2027		1.100.000,00	147.458,87	57,23% V okviru predvidenega je bilo do sedaj izvedeno: - ureditev prometne signalizacije na več območjih občine Nova Gorica, - sanacijo cest v Solkanu Žabji kraj – Šolska ulica in Ulica Mojke Štrukelj II, - ureditev in razširitev ceste Zagora – Preški vrh – Sveta Gora, - ureditev nevarnega odseka pri pokopališču v Lokah z izvedbo asfaltacije, - izvedla se je sanacija delov cest na Lokvah, - uredila se je prečna cesta na območju Majskih poljan. V nadaljevanju so predvidene še sanacije različnih odsekov dotrajanih vozišč v mestni občini Nova Gorica.	
16.	07382	OB084-24-0009	Postavitev sončnih elektrarn konzorcij MONG Postavitev sončne elektrarne na objektu Stadion Nova Gorica		161.610,00	161.610,00	100,00% Na objekt je bila postavljena sončna elektrarna s priključno močjo 157,50 kW. Pridobljene so pogodbe o priključitvi. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev sklada NOO. Projekt je zaključen.	
		OB084-24-0014	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Branik		140.887,00	140.886,57	100,00% Na objekt je bila postavljena sončna elektrarna s priključno močjo 120 kW. Pridobljene so pogodbe o priključitvi. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev sklada NOO. Projekt je zaključen.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
07382		OB084-24-0015	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Solkan	130.739,00	130.737,93	100,00%	Na objekt je bila postavljena sončna elektrarna s priključno močjo 90 kW. Pridobljene so pogodbe o priključitvi. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev sklada NOO. Projekt je zaključen.	
		OB084-24-0017	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Frana Erjavca	102.785,00	102.783,70	100,00%	Na objekt je bila postavljena sončna elektrarna s priključno močjo 90 kW. Pridobljene so pogodbe o priključitvi. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev sklada NOO. Projekt je zaključen.	
		OB084-24-0021	Postavitev sončnih elektrarn pri konzorcijskih partnerjih Občini Brda, DUNG in ŠC NG	175.753,00	102.820,50	58,50%	Sončna elektrarna so bile postavljene tudi pri ostalih partnerjih projekta - Občina Brda - 3, Šolski center Nova Gorica -1, Dom upokoencev Nova Gorica - 2. Vsi projekti so zaključeni	
17.	07391		<u>Urejanje poslovnih con</u>					
		OB084-24-0101	Urejanje poslovnih con	479.888,00	184.680,42	65,13%	Izvedena sta bila dva nasipa, ki povezujeta severno in južno stran cone PEC Kromberk z namenom izvedbe priključkov in navezav komunalne infrastrukture za severno ležeče parcele. V nadaljnji fazi bodo v sodelovanju z lastniki parcel izvedeni in urejeni še cestni priključki po že pripravljenem projektu PZI v obsegu razpoložljivih sredstev.	   

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	pp	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
18.	07395		IAS - Kulinarična in bivanjska kultura aleksandrink OB084-25-0005 Kulinarična in bivanjska kultura aleksandrink		126.453,00	0,00	51,69% Projekt Kulinarična in bivanjska dediščina aleksandrink se je pričel izvajati s 1.1.2026. V prvi polovici leta se izvajajo aktivnosti tako partnerjev, kot nosilke mestne občine. Projekt raziskuje, ohranja in predstavlja dediščino aleksandrink – žensk iz Primorske, ki so v preteklosti odhajale na delo v Egipt in druga območja Sredozemlja. Skozi njihove življenjske zgodbe, kulinarčne navade, običaje in način bivanja projekt oživilja spomin na pomemben del kulturne zgodovine ter povezuje preteklost s sodobnim razumevanjem dediščine. Poseben poudarek je namenjen tradicionalnim jedem, predmetom vsakdanjega življenja in zgodbam žensk, ki so s svojim delom in izkušnjami zaznamovale družine ter kraje svojega izvora. Realizacija stroškov bo v 2. polovici leta 2026. Projekt je v prvi polovici leta 2026 zastavil aktivnosti za doseganje rezultatov ob zaključku projekta: ohranjanje, revitalizacija in sodobna interpretacija dediščine aleksandrink ter večja prepoznavnost njihovega zgodovinskega, kulturnega in kulinarčnega izročila, izboljšanje pogojev za predstavitev dediščine aleksandrink ter izvajanje kulturnih, izobraževalnih in turističnih vsebin v Hiši aleksandrink.	
19.	08031		Projekt GreenInCities Projekt GreenInCities		212.966,00	33.179,75	15,71% V okviru projekta GreenInCities je bila za leto 2026 načrtovana izvedba investicije, ki pa se zaradi zamika pri pripravi projektne dokumentacije še ni pričela izvajati. Trenutno smo v zaključni fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je predvidena v kratkem, njegovo pridobitev pa pričakujemo do konca leta 2026. Kljub časovnemu zamiku aktivnosti na projektu potekajo skladno z usmeritvami projekta, investicija pa ostaja predvidena za izvedbo v naslednjem obdobju.	
20.	08035		Projekt ZAKRAS2 ZAKRAS2		1.870.729,00	6.281,05	0,83% Mestna občina Nova Gorica kot projektni partner sodeluje pri izvedbi aktivnosti, povezanih z varstvom narave na območju gradu Rihemberk in širšega kraškega prostora. Aktivnosti vključujejo izboljšanje pogojev za varstvo ciljnih vrst, ozaveščanje javnosti ter krepitev prepoznavnosti pomena območij Natura 2000. Z izvedbo projekta se prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni rabi prostora in povezovanju naravovarstvenih vsebin z lokalnim razvojem. Spreminja se dinamika porabe sredstev predvsem iz naslova stroškov za plače in same izvedba rekonstrukcije načrtovanih objektov - izvedba strešnih in stropnih konstrukcij. V letu 2026 se bo izdelalo projektno dokumentacijo DGD in PZI, pridobilo gradbeno dovoljenje ter izvedlo sanacijo strešnih in stropnih konstrukcij ter izvedlo nujno potrebna predhodna dela. osušitve konstrukcij severnega palacija - zgornje plošče z izvedbo Hi izolacije ter odvajanja meteornih vod. Preostale aktivnosti se zamikajo v leto 2027.	
21.	09076		Sredstva iz koncesnine državnih gozdov Investicijsko vzdrževanje gozdnih in občinskih cest 2024-2028		275.000,00	0,00	0,00% Sredstva iz te postavke so del koncesnine, ki jo upravljalec državnih gozdov plačuje državi za posekan les v državnih gozdovih. Del sredstev iz te proračunske postavke porabimo za vzdrževanje gozdnih cest in lokalnih poti, ki so bolj obremenjene zaradi povečanega odvoza lesa, del pa za vzdrževanje poljskih poti in odvodnih jarkov s kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. Predvidena je sanacija in preplastitev dela javne poti - JP 787 131 Trnovo – Voglarji	
22.	09099		Vzdrževanje protipožarnih presek Gradnja protipožarne infrastrukture		116.305,00	0,00	0,00% Izvajanje predvidenih ukrepov protipožarne infrastrukture se še ni izvedlo, ker je bil Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture - protipožarna infrastruktura objavljen šele pred kratkim. Mestna občina Nova Gorica bo na javni razpis prijavila več ukrepov za varstvo gozdov pred požari in sicer je predvidena gradnja in vzdrževanje protipožarnih poti in stez ter ureditev odjemnih mest za odvzem vode - hidrantov na območju Mestne občine Nova Gorica. V kolikor bomo na razpisu uspešni, se bo izvajanje začelo konec leta 2026.	
23.	09102		Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih tehnologij na območju Science City Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih tehnologij na območju Science City		1.266.426,00	0,00	0,00% Projekt je namenjen vzpostavitvi Centra zelenih tehnologij v obliki javno zasebnega partnerstva. Izvedba je odvisna od državnih in evropskih virov - razpisov.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
24.	<u>10158</u>		<u>Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza</u> Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica		362.800,00	362.799,58	100,00% Investicija uspešno zaključena. Odpravljene so bile vse ugotovljene pomanjkljivosti na področju požarnega varovanja, izvedene zahtevane meritve ter ustrezno dopolnjena PID dokumentacija elektroinštalacij.	
25.	<u>10206</u>		<u>Ureditev Rafutskega parka z Laščakovovo vilo</u> Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)		241.150,00	0,00	74,84% Z dokončno odločitvijo Državne revizijske komisije je izbran izvajalec za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo. Aktivnosti so v teku. Po prvotno planiranem se je izbira izvajalca zavlekla za 4 mesece.	
26.	<u>10219</u>		<u>Sanacija letnega bazena</u> Sanacija letnega bazena		886.192,00	882.186,16	99,99% Izvedena je bila celovita obnova ključnih konstrukcijskih, arhitekturnih in strojnih elementov objekta. Obnovljeni so bili bazenska školjka, dezinfekcijski bazenčki, keramika, prhe in garderobni prostori ter fasada objekta. Celovito je bila posodobljena tudi bazenska tehnika, vključno z razvodi bazenske vode, črpalkami, filtri in izmenjevalci. Prenovljena je bila celotna bazenska ploščad s podesi, senčili, ograjami in pripadajočo zunanjo opremo. Z zaključkom investicije so zagotovljeni sodobnejši, varnejši in kakovostnejši pogoji za uporabo letnega bazena.	
27.	<u>10270</u>		<u>Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas</u> Rekonstrukcija in prizidava OŠ Šempas		930.984,00	194.601,24	93,34% Dela na objektu potekajo skladno s terminskim planom. Izvedena je strešna plošča prizidka. Da se izkoristi čas šolskih počitnic se trenutno izvajajo navezave elektro in strojnih instalacij z obstoječim objektom ter rušitvena in gradbena dela v obstoječi šoli. Predviden zaključek del je v januarju 2027.	 

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2026 DO 30. 6. 2026

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni REB-1/2026 na dan 30.6.2026	Realizacija na dan 30.6.2026	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
28.	10272	OB084-23-0038	<u>Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan</u> Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	221.921,00	0,00	72,68%	Investicija uspešno zaključena. V okviru prenove je bila nameščena nova prežračevalna naprava, izvedena zvočna izolacija strojnice ter prenovljeni stropi in zamenjana svetila. Z izvedenimi ukrepi so se izboljšali pogoji za kakovostno prežračevanje, energetsko učinkovitost ter bivalno ugodje učencev in zaposlenih.	
29.	10277	OB084-24-0008	<u>Projekt DigARegion</u> Projekt DigARegion	132.984,00	33.759,71	59,13%	Namen projekta je izboljšanje digitalne pismenosti in dostopnosti do spletnih strani javnih ustanov za specifične ciljne skupine (slepi, gluhi, ...). Odobren je bil na 1. javnem razpisu za sofinancirane standardne projekte v okviru programa Interreg Slovenija-Italija. Sredstva v prvem polletju I.2026 so bila namenjena izvajanju strokovno-tehnične pomoči vodilnemu partnerju projekta (Mestni občini Nova Gorica), kritju stroškov izvajanja podporne točke za digitalno dostopnost ter izvedbe usposabljanj na temo zagotavljanja digitalne dostopnosti na osnovnem nivoju. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za delno zaposlenega na projektu. Sredstva za zaposlenega, izvajanje administrativno-tehnične pomoči in delovanje podporne točke bodo preko te proračunske postavke na voljo tudi v drugem polletju 2026. Do zaključka projekta (oktober 2026) bomo v sklopu projekt nabavili še opremo za zagotavljanje dostopnosti do informacij za ranljive skupine ter izvedbo zaključne konference v Novi Gorici.	
30.	10283	OB084-25-0021	<u>Investicijsko vzdrževalna dela in gradnja garaže za reševalna vozila</u> Umestitev reševalne službe v pritličje zahodnega krila in gradnja garaže za reševalna vozila	1.187.736,00	0,00	79,46%	Izvajalec je v začetku julija bil uveden v delo. Izvedel je zaščito napram delu objekta, ki bo med izvajanjem v uporabi in delom objekta, ki se bo obnavljal. Izvajajo se rušitvena dela.	
31.	10285	OB084-26-0002	<u>Prenova teniškega centra Nova Gorica</u> Prenova teniškega centra Nova Gorica	525.576,00	0,00	0,00%	Izvedba projekta je bila pogojena s pridobitvijo sredstev na razpisu za sofinanciranje. Zaradi neuspešne prijave, se investicija ne bo izvedla.	
